

Voortgangsrapportage IBP VTH december 2023

Inleiding

In het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (verder: IBP VTH) werken overheidspartijen aan een mix van korte en lange termijn doelen en maatregelen om ervoor te zorgen dat het VTH-stelsel verbetert en toekomstbestendig wordt. Elke deelnemende partij is verantwoordelijk voor adequate betrokkenheid van de eigen achterban, de benodigde bestuurlijke inbedding en de organisatie van het noodzakelijke commitment. Het programma is uitgewerkt in zes pijlerplannen. Deze vormen de basis voor de halfjaarlijkse rapportages over de voortgang van het programma.

Deze derde voortgangsrapportage is vastgesteld in de stuurgroep en het bestuurlijk overleg van het IBP VTH van respectievelijk 21 november 2023 en 6 december 2023. Naast de algemene voortgang wordt in deze rapportage per pijler ingegaan op het doel, de planning en mogelijk risico's voor de voortgang. Nieuw in deze voortgangsrapportage is dat ook de samenhang binnen en tussen pijlers is beschreven. Daarnaast is de voortgang van de drie try-outs beschreven die het programma op dit moment rijk is.

Voortgang algemeen

Het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving vraagt om een adequaat stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het IBP VTH werkt sinds augustus 2022 aan het versterken van dit stelsel dat nu niet altijd effectief en slagvaardig genoeg is. De partners in het programma slaan samen en gecoördineerd een brug tussen beleid en uitvoering en brengen de werelden van ministeries, bevoegde gezagen en omgevingsdiensten bij elkaar. In deze voortgangsrapportage doen we hieronder in detail verslag van de vorderingen, te beginnen met de grote lijn.

Tekenen van verbetering en verandering

In het afgelopen half jaar is opnieuw vooruitgang geboekt en nog meer dan voorheen zijn de tekenen van verandering en verbetering zichtbaar. Zo pakken de try-outs knelpunten aan en is gestart met implementaties. Duidelijke criteria ondersteunen de ontwikkeling naar robuuste omgevingsdiensten. Na de inmiddels doorlopen zelfbeoordeling realiseren sommige omgevingsdiensten zich dat ze samen beter kunnen presteren. Dit leidt o.a. tot fuseren. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking en bestaande samenwerking krijgt nieuw elan. Ook de doorontwikkeling van Omgevingsdienst NL (verder: ODNL) als basis voor versterking en vernieuwing maakt het VTH-stelsel als geheel sterker en toekomstbestendig. Dit geldt evenzeer voor de ontwikkeling van de meerjarenstrategie 2024-2028 voor de ODNL Academie. Voor de monitoring van het stelsel is de opzet voor de Staat van VTH gereedgekomen.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat op een aantal onderwerpen de voortgang nog niet is wat we hebben afgesproken met elkaar. Dat heeft o.a. te maken met het vinden van goede projectleiders, langdurende inhuurprocessen en de afhankelijkheid van externe partijen. Vertraging treedt ook op omdat vraagstukken ingewikkelder blijken dan vooraf gedacht. In de tabel is dit zichtbaar gemaakt. Dit is overigens geen aanleiding om aan te nemen dat (sub)doelen niet gehaald worden.

Het begin van een beweging

Allerbelangrijkste resultaat is dat het laatste half jaar nog nadrukkelijker een positieve beweging te zien is. Mensen met een gedeelde ambitie die vooruit willen in het VTH-domein zoeken elkaar op en motiveren elkaar. Bestuurders en beleidsmedewerkers, maar ook de individuele vergunningverleners, toezichthouders met de voeten in de klei. Professionals die, de frustratie voorbij, doelgericht en pragmatisch samen blokkades in het VTH-stelsel opheffen. De beweging is zichtbaar binnen de algemene besturen van de omgevingsdiensten, bestuurlijke koplopers zijn actief in bijeenkomsten, er is meer aandacht voor de relatie opdrachtgever- opdrachtnemer (OGON) en de community versterking VTH (www.versterkingvth.nl) blijft gestaag doorgroeien.

Tegelijkertijd merken we dat het op onderdelen spannend wordt, bijvoorbeeld om structureel te komen tot robuuste omgevingsdiensten en de bijhorende financiering waar nu nog onduidelijkheid over is. De zorgen om te komen tot robuustheid zijn in de stuurgroep en het bestuurlijk overleg benoemd en dit heeft geleid tot een brief van IenW (zie tabel bij pijler 1). Ook weten we inmiddels dat het vanuit informatievoorziening noodzakelijk is om meer te uniformeren, maar dat leidt ook tot het inleveren van autonomie en soms de noodzaak om een andere weg in te slaan en daarmee tot desinvesteringen. Toch zien we bij de deelnemende partijen een grote bereidheid om, met het gezamenlijke doel voor ogen, soms ook pijnlijke keuzes te maken.

Het IBP VTH stelt zich tot doel deze beweging van positieve krachten in beleid en uitvoering te blijven versterken. Daarbij is enige haast geboden. Het IBP VTH houdt eind september 2024 op, maar de impact van het programma moet veel verder reiken. Op die toekomst wordt volop gekoerst. Enerzijds gericht op robuuste omgevingsdiensten met een duidelijk mandaat die de kwaliteit van onze leefomgeving behouden én structureel verbeteren. Anderzijds ook gericht op opdrachtgevers die de toegevoegde waarde van omgevingsdiensten herkennen én benutten en die ook zelf investeren in de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is het vergezicht waar we naar toe werken.

Randvoorwaarden voor goed functionerend stelsel

De partners in het programma zijn deze verslagperiode druk bezig geweest met het creëren van randvoorwaarden voor een goed functionerend VTH-stelsel dat klaar is voor de uitdagingen van nu en later. Op meerdere manieren en op meerdere fronten. Het fundament is gelegd voor een kennisinfrastructuur waar alle partijen kennis brengen, halen en delen. Een handreiking voor het maken van regionale probleem- en risicoanalyses (zie ook kopje Ketentoezicht, mandatering en regionale planning) is in de maak, met aandacht voor maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en circulaire economie. Ook zijn er stappen gezet met het werken aan de kwaliteit en eenduidigheid van data, cruciaal voor alle partijen binnen het VTH-stelsel. Een andere randvoorwaarde waarin een belangrijk stap is gezet is in het uniform registreren van data, de definitiestudie uniforme registratie milieubelastende activiteiten is afgerond.

Voortgang in samenhang, met informatievoorziening VTH als randvoorwaarde

In onderstaand overzicht is voor alle pijlers van het IBP VTH de voortgang over het afgelopen half jaar beschreven. Onderwerpen binnen een pijler hebben samenhang, maar er is uiteraard ook samenhang tussen de verschillende pijlers. Veel activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met uitwisseling van kennis en data vaak als cruciale component. Een belangrijke randvoorwaarde is daarom het verbeteren van de informatievoorziening; pijler 3 richt zich hier specifiek op. Een goed functionerend VTH-stelsel kan niet zonder datastelsel waarbij de beschikbare data en daarmee kennis daadwerkelijk uitgewisseld kunnen worden. Daarom is binnen het IBP VTH het informatielandschap in kaart gebracht, wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de datakwaliteit bij vergunningverlening en bij toezicht, en worden stelselafspraken gemaakt over uitwisselen van gegevens. De informatievoorziening die zo ontstaat is een cruciale randvoorwaarde voor andere activiteiten, zoals het opstellen van risicoanalyses (pijler 5) en de monitoring van de kwaliteit van het milieutoezicht (pijler 6) en – meer specifiek – de ‘Staat van VTH’. Op de risico’s die tijdens de gateway-review zijn gesignaleerd, is inmiddels actie ondernomen.

Vorderingen bij robuustheid stelsel

Pijler 1 (robuuste omgevingsdiensten en financiering) en pijler 6 (monitoring) zijn ook nauw verweven. De Staat van VTH is een instrument in ontwikkeling dat de kwaliteit van de uitvoering gaat helpen bewaken. Dit nieuwe periodieke onderzoek meet onder andere de actuele robuustheid van het stelsel. Hierbij spelen – uiteraard - ook de robuustheidscriteria voor omgevingsdiensten een rol. Deze criteria waarborgen dat omgevingsdiensten voldoende weerstandsvermogen en innovatief vermogen hebben om in te spelen op een takenpakket dat mede door maatschappelijke en landelijke opgaven kan veranderen. Voor de Staat van VTH is deze verslagperiode een blauwdruk gemaakt en geaccordeerd. De robuustheidscriteria zijn geborgd in zes meetbare KPI’s. In oktober hebben alle omgevingsdiensten zichzelf getoetst aan de KPI’s. Het resultaat is in december door de staatssecretaris beoordeeld. Twee omgevingsdiensten zijn op dit moment robuust. Op basis van deze beoordeling maken de overige omgevingsdiensten voor 1 april 2024 een plan van aanpak om binnen twee jaar robuust te worden.

Ketentoezicht, mandatering en regionale planning

De voortgang op het gebied van robuustheidscriteria is niet alleen van belang voor succesvolle monitoring van het milieubeleid. De grotere robuustheid van omgevingsdiensten heeft ook een positief effect op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging (pijler 2). Zo wordt het ketentoezicht eenvoudiger en overzichtelijker als er minder ketenpartners zijn en als omgevingsdiensten meer 'body' hebben. Het is helaas niet gelukt om het project ketentoezicht op het voorziene moment te starten. Inmiddels is er een projectleider gevonden die de eerste voorbereidingen in gang heeft gezet. Mandatering is een belangrijk onderdeel van pijler 5 (Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving): een goed mandaat, voor alle deelnemers aan de omgevingsdienst, helpt de ketenhandhaving effectiever in te richten. Een voorstel voor modelmandaat is in januari 2024 gereed voor besluitvorming. Er is nog een dwarsverband tussen deze twee pijlers, met name waar het de regionale planning betreft. De inzet van het OM moet vooraf geregeld worden door beleid en uitvoering op regionaal niveau op elkaar af te stemmen. Belangrijke voortgang op dit front: er wordt een handreiking ontwikkeld voor regionale planning die landelijk wordt uitgerold, inclusief een format voor de probleem- en risicoanalyse en het meerjarenprogramma (BIG-8). In Q1 van 2024 is deze handreiking gereed, waarna ook een implementatietraject volgt. Natuurlijk is er ook bij regionale planning een samenloop met het onderwerp financiering uit pijler 1.

Try-outs: de eerste resultaten

Inleiding

Een goed functionerend VTH-stelsel kan niet zonder solide kennisinfrastructuur. Deze infrastructuur is nu op te veel onderdelen nog niet op orde. Kennis is versnipperd, niet gevalideerd of onvoldoende vertaald naar informatie waar andere professionals mee uit de voeten kunnen. Informatie die het bevoegde gezag en een omgevingsdienst juist nodig hebben om hun rol goed op te kunnen pakken. Binnen het IBP VTH wordt gewerkt aan het ontwikkelen van krachtige kennisplatforms (pijler 4). Input vanuit meerdere bronnen is behulpzaam bij de opbouw van kennis. Try-outs binnen het IBP VTH bieden de mogelijkheid knelpunten in de uitvoering onder de loep te nemen. De uitkomsten hiervan leveren kennis op om het stelsel te kunnen verbeteren. Hun voortgang is hieronder kort beschreven.

Omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen

Het project Try-out ZZS richt zich op de omgang van bevoegde gezagen met emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). RIVM en ODNL hebben hiervoor een robuust samenwerkingsverband ontwikkeld en zorgen samen voor de afstemming met de afzonderlijke omgevingsdiensten. Dit gebeurt op het niveau van de huidige indeling van alle omgevingsdiensten tezamen, op het niveau van de zes bovenregionaal samenwerkende Brzo-omgevingsdiensten en op landelijk niveau met ODNL. ODNL zet in dit model 'ODNL-regiotrekkers' in als verbindende schakel voor de verschillende omgevingsdiensten in hun regio. Het RIVM zet 'RIVM-liaisons' in die, samen met de regiotrekkers, kennisvragen signaleren die ze eventueel ook zelf kunnen oppakken.

Veelbelovende start, op weg naar structureel samenwerkingsverband

De samenwerking heeft als doel om bestaande kennis optimaal te benutten en om direct aan de slag te gaan met nieuwe kennisvragen. De start is veelbelovend. Er zijn ad hoc vragen (toonbankvragen), maar ook meer structurele kennisvragen die via projecten worden opgepakt. Voor landelijke, meer structurele kennisvragen worden projectleiders en experts ingezet vanuit zowel ODNL als RIVM. Waar mogelijk en relevant wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren, zoals het al goed lopende ZZS Kennisnetwerk, de Kennisschakelpunten, en bestaande samenwerkingen tussen omgevingsdiensten en GGD-en. Eind 2024 vindt een eindevaluatie plaats van de try-out. Dan wordt ook duidelijk hoe de samenwerking een vervolg krijgt – de ambitie is om het samenwerkingsverband structureel te maken - en of en hoe deze ook ingezet zou kunnen worden voor andere kennisvelden in het VTH-stelsel. De Tweede Kamer is al eerder op 18 oktober 2023 geïnformeerd over voortgang van deze try-out.[1] Op dit moment wordt gewerkt aan het samenstellen van een programmacollege en het opzetten van een zogeheten ‘lerende evaluatie’.

Grip op indirecte lozingen

Bedrijven lozen soms zeer gevaarlijke en zorgwekkende stoffen in het riool, zoals PFAS. Dit kan problemen opleveren voor de werking en zuivering van het riool. De stoffen kunnen ook op het oppervlaktewater terecht komen. In mei 2023 is de try-out Grip op Indirecte Bedrijfslozingen van start gegaan, een gezamenlijk project van de Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied, IJmond, en Noord-Holland Noord, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en alle 26 gemeenten in het Noorderkwartier. Als onderdeel van de try-out bezoeken de drie omgevingsdiensten ongeveer negentig bedrijven. Ook kunnen de toezichthouders en handhavers van de omgevingsdiensten en het hoogheemraadschap een gezamenlijke opleiding waterkwaliteit en controle van indirecte lozingen volgen. Er wordt bij de try-out ook goed gekeken naar de juiste monsternamen van afvalwater.

Deelproducten ontwikkeld en geoptimaliseerd

In voorbereiding op de try-out zijn meerdere deelproducten ontwikkeld, zoals een (digitale) checklist voor bedrijfsbezoeken, een standaardanalysepakket per bedrijfsbranche, en een samenwerkingsovereenkomst voor verwerking van gegevens. Tijdens een evaluatiebijeenkomst in oktober zijn de eerste ervaringen uitgewisseld waarmee een aantal optimalisaties doorgevoerd worden voor het vervolg van de bedrijfsbezoeken. Tot en met januari 2024 worden data verzameld. In een afrondende bijeenkomst worden de uitkomsten en inzichten uit de try-out met de deelnemers besproken. De eindrapportage aan de stuurgroep (eerste kwartaal 2024) zal dieper ingaan op de resultaten van de opleiding en de kennisuitwisseling tussen de omgevingsdiensten. Ook de wijze waarop de kennis landelijk is gedeeld is hierin opgenomen.

[1] KST 28089-268

Gesloten bodemenergiesystemen: beter toezicht en handhaving bij de aanleg

Een signaalrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) liet eerder al zien dat het toezicht en de handhaving bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (verder: GBES) tekortschiet. Het draagt bij aan slechte naleving door bedrijven, wat onder andere een negatief effect heeft op de kwaliteit van het grondwater en daarmee uiteindelijk ook op het drinkwater. De try-out GBES wil hier verbetering in aanbrengen via verbetering van de kennisinfrastructuur en informatiepositie van omgevingsdiensten. In november 2023 is een (vernieuwd) plan van aanpak aan de stuurgroep voorgelegd met de focus op drie actiepunten: kennis en informatie, juridische basis, communicatie.

Kennis en communicatie

Omgevingsdiensten hebben soms onvoldoende kennis over efficiënt, kwalitatief goed toezicht op GBES. Ook zijn de effecten van GBES in een gebied niet altijd duidelijk. De try-out zet in op structurele verbetering. Naast trainingdagen wordt een opleiding opgezet en een kennisplatform. De try-out faciliteert ook het gesprek tussen gemeenten, omgevingsdiensten en ILT over hun rol en verantwoordelijkheid bij toezicht en handhaving. Hoe maak je afspraken, hoe maak je inzichtelijk waar eventueel aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn, hoe verbeter je de registratie van informatie? Ander onderdeel is het versterken van de communicatie over het belang van toezicht op GBES. Richting gemeenten, die dit belang niet altijd inzien, maar ook richting projectontwikkelaars en woningeigenaren die zich onvoldoende bewust zijn van de risico's van de aanleg van een GBES.

Richting eindproduct

De try-out moet leiden tot concrete verbeteringen in de uitvoering. Dit gebeurt door het organiseren van trainingdagen, het opzetten van een opleidingsprogramma en een kennisplatform, en bijv. op basis van de uitkomsten van bodemonderzoeken om een betere risicoanalyse te maken t.b.v. een haalbaarheidsstudie. Het versterken van de juridische basis leidt wellicht tot aanbevelingen voor aanpassingen van wet- en regelgeving. De try-out loopt tot en met Q3 van 2024. De tussentijdse voortgang wordt gedeeld met de stuurgroep en indien nodig met het bestuurlijk overleg.

Thematische onderzoeken ILT

Inleiding

In pijler 6 van het IBP VTH (monitoring kwaliteit milieutoezicht) is door de ILT, in opdracht van lenW, een systeem ingericht voor het uitvoeren van thematische en signalerende onderzoeken. De thematische onderzoeken hebben als doel te reflecteren op het functioneren van het VTH-stelsel milieu. In kaart gebrachte knelpunten kunnen vervolgens weer dienen als input bij de uitwerking van de verschillende pijleronderwerpen (met acties, thema's etc.) binnen het IBP VTH. Inmiddels zijn er twee thematische onderzoeken uitgevoerd en het derde onderzoek loopt. Het eerste onderzoek gaat over de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (e-waste) en het tweede onderzoek over asbestverwijdering en het VTH-stelsel. Beide onderzoeken zijn afgerond. Het e-waste onderzoek is inmiddels voorzien van een beleidsreactie die met de Tweede Kamer is gedeeld. Ook het onderzoek naar asbest zal worden voorzien van een beleidsreactie. In de voortgangsrapportage wordt hieronder kort ingegaan op het thema asbest. Het onderwerp van het eerstvolgende thematische onderzoek is geluid (zie voor overige onderwerpen de tabel).

Asbest

Asbest is een natuurlijk materiaal opgebouwd uit kleine vezels en heeft o.a. isolerende, hittebestendige en brandwerende eigenschappen. Asbest kende vele toepassingen, maar vooral in bouwmaterialen. Gezien de zeer grote gezondheidsrisico's mogen bedrijven sinds 1 juli 1993 geen asbest meer gebruiken, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 2019 staat asbest op de lijst van ZZS.

Het thematische onderzoek 'asbest' richt zich op het beschermen van de leefomgeving bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende afvalstoffen i.r.t. het VTH-stelsel. Omgevingsdiensten spelen hierin een belangrijke rol omdat het toezicht op bedrijfsmatige asbestverwijdering een basistaak is die moet worden uitgevoerd door een omgevingsdienst. Er is ook gekeken naar het functioneren van andere partijen in het asbeststelsel, in hun relatie tot de omgevingsdiensten. Het onderzoek richt zich op de huidige situatie onder de bestaande wet- en regelgeving.

De ILT constateert bij de uitvoering een grote mate fragmentatie en andere knelpunten in het VTH-stelsel die aanleiding geven tot blijvende zorg over de uitvoerbaarheid van het toezicht. Het gaat o.a. om de wijze van financiering van asbesttaken (pijler 1), het uitwisselen van asbestgegevens in de keten (pijler 2 en 3), uniformiteit in mandatering van asbesttaken (pijler 5), uitbreiding van kennisplatforms en overlegstructuren op het gebied van asbest (pijler 4), intensivering strafrechtelijk handhaving (pijler 2) en thematische onderzoek als asbest borgen in de Staat van VTH (pijler 6). Reden voor de ILT om dit onderwerp als themaonderzoek op te pakken binnen het IBP VTH.

Gerealiseerde (tussen)producten



- PIJLER 1**
- Robuustheidscriteria
 - Toetsing door OD's aan robuustheidscriteria
 - Checklist voor opstellen plan van aanpak robuustheids-criteria
 - Huidige situatie financiën OD's in beeld



- PIJLER 2**
- LHSO vastgesteld
 - Leidraad termijnen en sancties
 - Besluitvorming aansturing politiecapaciteit
 - Milieucriminaliteit opgenomen in Veiligheids-agenda 2023 – 2026 / Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB)



- PIJLER 3**
- Juridische analyse
 - Data-analyse vergunningverlening
 - Definitiestudie MBA's
 - Vertaling definitiestudie MBA's naar ontwerp voor register inrichtingen MBA's
 - Gateway-review
 - Opvolging aantal onderwerpen n.a.v. gateway-review



- PIJLER 4**
- Opzet arbeidsmarktcampagne
 - Implementatieplan ODNL Academie
 - Visie op kennis



- PIJLER 5**
- Opzet modelmandaat
 - Uitwerking modelmandaat






- PIJLER 6**
- Thematisch onderzoek e-waste
 - Thematisch onderzoek asbest
 - Blauwdruk Staat van VTH
 - Systematiek visitaties opgesteld en tien visitaties afgerond

Resultaten IBP-VTH December 2023 Voortgang per pijler

- Volgens planning pijlerplan
- Wijkt af van pijlerplan
- Wijkt sterk af van pijlerplan



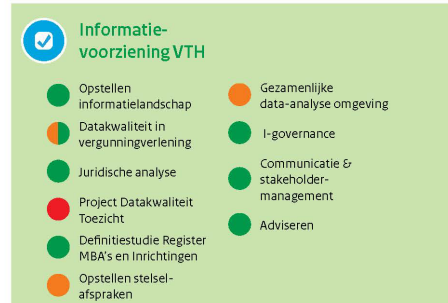



- Deel acties etc. volgens planning pijlerplan en deel afwijkend
- Deel acties wijkt af van pijlerplan en deel wijkt sterk af






Voortgang per pijler

In het onderstaande overzicht zijn de verschillende onderwerpen (met acties, thema's etc.), de behaalde resultaten en planningen weergegeven per pijler.

Legenda:


	Volgens planning pijlerplan zoals gedeeld met de Tweede Kamer in mei jl. 2023D10566
	Wijkt af van planning pijlerplan (geen consequenties voor realiseren overall planning)
	Wijkt sterk af van planning pijlerplan
	Nieuw onderwerp/thema/actie etc. toegevoegd t.o.v. pijlerplan [datum VGR waarin voor het eerst opgenomen]
	Afgerond onderwerp/thema/actie etc.
	Risico's die mogelijk een negatief effect hebben op het behalen van de (overall) planning

Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/ risico's	
1 Robuuste omgevingsdiensten en financiering	(1) Robuustheid omgevingsdiensten	<p>Voor het bepalen van de ondergrens zijn robuustheidscriteria opgesteld. Eerst is robuustheid gedefinieerd en vervolgens zijn hiervoor zes meetbare KPI's opgesteld met een normering. De robuustheidscriteria en het toetsingskader zijn vastgesteld in het bestuurlijk overleg (22 juni 2023). Op 13 september 2023 is een aanvulling op het toetsingskader vastgesteld.</p> <p>Alle omgevingsdiensten hebben volgens planning vóór 3 oktober 2023 het resultaat van hun zelfbeoordeling ingediend. In oktober 2023 heeft een technische check en analyse plaatsgevonden van de resultaten van alle 28 omgevingsdiensten (aantal omgevingsdiensten per 1/1/2024). De resultaten zijn besproken in de stuurgroep op 21 november 2023 en het bestuurlijk overleg van 6 december 2023. </p> <p>De staatssecretaris van lenW heeft in een brief haar zorgen geuit richting de algemene besturen van de omgevingsdiensten dat er tot nu toe vooral is gekeken naar de financiering van de omgevingsdiensten en dat de mogelijkheid tot fusie (en congruentie) weinig wordt verkend. Verder informeert de staatssecretaris van lenW in december de algemene besturen van de omgevingsdiensten over haar beoordeling van de robuustheid'. Dit vanuit haar rol als stelselverantwoordelijke.</p>	<p>De staatssecretaris van lenW stuurt de beoordeling per omgevingsdienst voor 15 december 2023 door aan de betreffende omgevingsdienst.</p> <p>In de volgende fase (Q2 van 2024) worden de plannen van aanpak geanalyseerd en wordt hierover gerapporteerd aan de Tweede Kamer.</p> <p>Niet robuuste omgevingsdiensten moeten uiterlijk 1 april 2026 robuust zijn. De voortgang wordt tussentijds gemonitord.</p>	
	(2) Advisering omgevingsdiensten op omgevingsplannen	<p>Volgens de commissie Van Aartsen moeten omgevingsdiensten betrokken zijn bij het opstellen van de milieunormen in het omgevingsplan. De commissie is van oordeel dat de omgevingsdienst een inhoudelijk advies moet geven over de milieunormering in omgevingsplannen en een uitvoeringstoets op de normering zou moeten uitvoeren.</p> <p>Advies over de vorm en invulling van de wijze van betrokkenheid van omgevingsdiensten bij het opstellen van de milieunormen in het omgevingsplan is afgerond. Het bestuurlijk overleg heeft hierover een besluit genomen op 22 juni 2023.</p>	<p>In Q 1 van 2024 worden de verschillende sporen verder uitgewerkt; mede vanwege de invoering van de Omgevingswet is er beperkte capaciteit beschikbaar voor deelname aan de werkgroep.</p>	
	(3) Financiering van de omgevingsdiensten	(A) Het inzichtelijk maken hoe omgevingsdiensten nu gefinancierd worden (IST-situatie). De analyse van de huidige financiering systematiek van de omgevingsdiensten is in de stuurgroep van 9 juni 2023 ter informatie ingebracht. 	<p>Vanuit de werkgroep wordt op dit moment gewerkt aan twee onderdelen.</p>	<p>De analyse is afgerond.</p> 
		(B) Ontwikkelen voorstel voor robuuste financiering. Er is een contourennotitie opgesteld die ter consultatie is voorgelegd aan de partners. Deze contourennotitie is in november samen met het opgehaalde commentaar ter informatie voorgelegd aan de stuurgroep. De verwerking hiervan in een eindrapportage is niet gerealiseerd in 2023.	<p>De bestuurlijke vaststelling van de opzet voor robuuste financiering – verwerkt in een eindrapportage – is gepland in Q2 van 2024.</p> <p>Het concept van de eindrapportage wordt ter consultatie aan de partners voorgelegd.</p>	
(4) Kwaliteitscriteria	<p>Het doel is om te komen tot een herziene set van kwaliteitscriteria 3.0 die beter aansluit bij de uitvoering onder de Omgevingswet en nieuwe opgaven zoals circulaire energie.</p> <p>In het project wordt nauw samengewerkt met pijler 4 - project opleiding, scholing en arbeidsmarkt.</p>	<p>In Q1 van 2024 wordt het plan van aanpak opgesteld met daarbij de scope.</p> <p>In Q3 van 2024 wordt de set kwaliteitscriteria 3.0 opgeleverd.</p> <p>Vanaf Q4 van 2024 moeten de kwaliteitscriteria structureel geborgd zijn met als doel de criteria actueel te houden en ervoor te zorgen dat de organisaties continue voldoen aan de criteria.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Risico: voldoen aan de kwaliteitscriteria is een onderdeel van de robuustheidscriteria. Aanpassingen aan de kwaliteitscriteria kunnen daardoor invloed hebben op het voldoen aan de robuustheidscriteria. In het proces van het doorontwikkelen van de kwaliteitscriteria wordt hier rekening mee gehouden.</p> </div>		

Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's
2 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging	(1) Verbeteren informatie-uitwisseling	Bestaande overleggen en convenanten tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke kant zijn geïnventariseerd. Er heeft een juridische analyse plaatsgevonden met betrekking tot welke informatie wettelijk gezien moet worden verzameld en gedeeld. Het inrichten van de overlegstructuren gebeurt in nauwe samenhang met pijler 5 (de BIG-8).	Q1 van 2024: overlegstructuren in regio's/provincies inrichten. Juni 2023 Q1 van 2024: voor de zogenaamde 'witte vlekken' convenanten opstellen, waarbij alle relevante ketenpartners convenantpartner zijn.
	(2) Ketentoezicht	Het project heeft tot doel te komen tot een structurele procedure die partners in het ketentoezicht volgen en levert een handreiking op voor het opzetten van ketentoezicht. Er is nog geen projectplan vastgesteld. Daarmee zal de planning van oplevering niet gehaald worden. Deze stond op Q1 in 2024, maar wordt aangepast.	Planning wordt opnieuw gemaakt door de projectleider die in november 2023 is gestart. In Q1 van 2024 wordt de nieuwe planning ter informatie met de stuurgroep gedeeld. Juni 2023
	(3) Verbeteren samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving	Het onderwerp omvat een tweetal acties: (1) Plan van aanpak voor daadwerkelijke implementatie LHSO, met twee componenten: (A) Vaststelling/goedkeuring door bevoegde gezagen. Dit stond gepland voor Q2 van 2023, maar is nog niet gerealiseerd naar aanleiding van de informatieset voor bevoegde gezagen die is opgeleverd in 2023. (B) Het daadwerkelijke gebruik door toezichthouders, boa's, opsporing en OM. Onderdeel van de implementatie is ook monitoring. Dit stond gepland voor Q4 in 2023, maar zal plaatsvinden in Q1 van 2024. De monitoring moet gaan plaatsvinden d.m.v. visitaties en Staat van VTH (pijler 6). (2) Formaliseren van de Strategische Milieukamer (SMK). Dit stond gepland voor Q2 van 2023, maar is nog niet gerealiseerd. Er is nog geen nieuwe planning.	Vraag stand van zaken vaststelling is uitgezet via directiesecretarissen OD's en ODNL. In Q1 van 2024 wordt de stuurgroep nader geïnformeerd. De planning van (1B) is bijgesteld naar Q1 in 2024. Voor de realisatie zullen meer (financiële) middelen nodig zijn. Planning (2) SMK wordt opnieuw gemaakt. Dit gebeurt nadat JenV met leden SMK en andere verantwoordelijke ministeries bepaald hebben met welk juridisch instrument en met welke inhoud de formalisatie vorm moet krijgen. De stuurgroep wordt in Q1 van 2024 geïnformeerd over de s.v.z.
	(4) Effectievere inzet instrumentarium toezicht en handhaving	De landelijke leidraad termijnen en sancties is geactualiseerd met de meest recente jurisprudentie en bedragen van handavingsbeschikkingen en de scope is verbreed door ook expliciet aandacht te geven aan de bestuurlijke waarschuwing en het innen van dwangsommen. Deze is samen met de Landelijke handavingsstrategie Omgevingsrecht terug te vinden op de site van het Informatiepunt Leefomgeving. Er lopen verder nog de volgende acties: (A) Het openbaar maken handavingsbeschikkingen op het gebied van Brzo-inspecties. Het project is later gestart door het uitvallen van eerdere projectleiders. (B) Invoering geprioriteerde thema's. De deelnemers in de Landelijke Milieukamer bouwen hun informatiepositie op rond deze thema's. (C) De ILT voert een verkenning uit om handavingsbeschikkingen openbaar te maken en neemt in deze verkenning ook een proeftuin op omtrent het openbaar maken. (D) Onderzoeken hoe de Brzo-omgevingsdiensten de bezoekverslagen op het gebied van Wabo toezicht openbaar kunnen maken. Dit project volgt op het project openbaar maken handavingsbeschikkingen. Omdat het project openbaar maken handavingsbeschikkingen later is gestart zal ook dit project later starten dan gepland. (E) Onderzoek naar de feitelijke toepassing van de Europese eis van evenredige, doeltreffende en afschrikwekkende sancties en hoe die toepassing (beter) geborgd kan worden. (F) Onderzoek wat beleidsdirecties onder effectieve instrumenten verstaan en hoe de effectiviteit gemeten kan worden. (G) Verkenning openbaarmaking handavings-beschikkingen door OD's conform de methodiek van Brzo omgevingsdiensten. Dit project volgt op (D), maar heeft vertraging opgelopen vanwege vertraging bij (A). Inmiddels heeft een aantal omgevingsdiensten zich gemeld om wel al een start te gaan maken met dit project. (H) Visitaties over eenduidige toepassing aanpak zorgbedrijven Brzo inclusief koppeling met de regionale overleggen. (I) Verkenning hoe bedrijven kunnen bijdragen aan normconform gedrag of het vergroten van awareness.	De planning van (A) is: in Q2 van 2024 is de handreiking afgerond. De planning van (B) is: in Q1 van 2024 ingevoerd. De planning van (C) is: in Q1 van 2024 is handreiking afgerond. Planning voor (D) wordt opnieuw gemaakt en in Q1 van 2024 ter informatie met de stuurgroep gedeeld. Juni 2023 De planning van (E) is: in Q4 van 2024 opgeleverd. Juni 2023 De planning van (F) is: in Q4 van 2024 opgeleverd. Planning voor (G) wordt opnieuw gemaakt en in Q1 van 2024 ter informatie met de stuurgroep gedeeld. Planning voor (H) wordt opnieuw gemaakt door de projectleider die eind 2023 is gestart. In Q1 van 2024 wordt de nieuwe planning ter informatie met de stuurgroep gedeeld. De planning van (I) is: in Q4 van 2024 afgerond. Juni 2023

		(J) Kwaliteit PV's verder verhogen, in samenhang met pijler 4. (K) Inzet op verbeteren datakwaliteit (project OM/JenV; gerelateerd aan Inspectieweek). Dit project vindt plaats onder pijler 3.	De planning van (J) is: In Q2 van 2024 ingevoerd. De planning van (K) is: In Q2 van 2024 ingevoerd.	Juni 2023
	(5) Meer prioriteit en inzet van capaciteit boa's, politie, OM en ZM	Er zijn meerdere acties: (A) Bij het inrichten van de BIG-8 sluit het OM zodat prioritering van strafrecht op de juiste plek in de BIG-8 zit (link met pijler 5). (B) 1. Bestuurlijke aandacht voor milieucriminaliteit. Dit staat structureel op de agenda. In Q2 van 2023 is deze actie gerealiseerd. 2. Er lopen nog acties om meer structureel de focus te houden die niet geheel volgens planning lopen. (C) Politie rapporteert periodiek over de aanpak van milieucriminaliteit. (D) Uitwerken en vaststellen centraal sturingsmodel milieuoopsporingscapaciteit politie. Dit is in Q1 van 2023 gerealiseerd.	De planning van actie (A) is: In Q1 van 2024 afgerond. (B) 1. Milieucriminaliteit is een vast punt op agenda bestuurlijk omgevingsberaad (B) 2. Eerstvolgende actie: De bestuurdersconferentie zal plaatsvinden op 29 januari 2024. De planning van actie (C) is in Q1 van 2024 afgerond. (D) Het centraal sturingsmodel is afgerond.	
<i>Pijler/titel</i>	<i>Onderwerpen</i>	<i>Voortgang en doel</i>	<i>Planning/risico's</i>	
3 Informatie-voorziening VTH	(1) Opstellen informatielandschap	Het doel is het informatielandschap en de knelpunten daarin in beeld te brengen, verder uit te werken en een toekomstbeeld te schetsen. De stuurgroep heeft de bestaande situatie (het vertrekpunt) van het informatielandschap vastgesteld en ingestemd met het advies. Er wordt toegewerkt naar de ambitieniveaus informatisering en platformisering d.m.v. een zogenaamd 'veranderpad'. De afronding was voorzien in 2023, maar is doorgeschoven naar Q1 van 2024. T.b.v. het toekomstbeeld wordt ook verkend welke plek LBR en GIR in het informatielandschap VTH hebben.	In de laatste stuurgroep van 2023 (beoogde datum 20 december) wordt het 'veranderpad' besproken. In Q1 van 2024 wordt het 'veranderpad' opgeleverd.	
	(2) Datakwaliteit in vergunningverlening	Een eerste verkenning over vergunningverlening en informatievoorziening (informatiebehoefte) is afgerond. De acties A, B, C en D zijn geland in een integrale analyse m.b.t. het verbeteren van de vergunningverlening. De stuurgroep heeft ingestemd met de ontwikkelrichting: (A) Afspraken/plan maken voor online beschikbaar stellen van IPPC-vergunningen. (B) Verkennen en ontwikkelen van landelijke standaarden en bijbehorend ICT-platform. De planning om tot afronding te komen is niet gerealiseerd in 2023. (C) Verkenning landelijke voorziening voor digitaal ontsluiten van (data uit) vergunningen. Gerelateerde acties zijn: (D) Doorontwikkeling Altijd Actuele Digitale Vergunning. De beoogde planning is niet gehaald. (E) Gezamenlijke (data) analyse omgeving zal in een volgende VGR als apart onderwerp worden opgenomen. De beoogde planning is niet gehaald. (F) Publiceren inspectierapporten en uitvoeringsplanning IPPC bedrijven & openbaarmaking (gerelateerd aan (A)). (G) Verkenning naar een landelijk register wordt mogelijk in een volgende VGR als apart onderwerp opgenomen.	De planning voor het onderwerp datakwaliteit vergunningverlening als geheel is bijgesteld vanwege de integrale analyse m.b.t. het verbeteren van de vergunningverlening. Een aantal acties worden alsnog volgens pijlerplan opgeleverd. Risico: de functie voor projectleider 'datakwaliteit in vergunningverlening' is nog niet ingevuld waardoor de planning (verder) vertraging oploopt. Actie (A) en (C) worden opgeleverd in Q1 in 2024. Voor actie (B) geldt een geplande afronding in Q3/Q4 2024 volgens het pijlerplan. Zodra er een projectleider is wordt er een planning gemaakt voor actie (D). Daarna wordt deze ter informatie met de stuurgroep gedeeld.	

			<p>Voor actie (E) geldt dat eind Q1 van 2024 een analyse beschikbaar is. Voor actie (F) volgt een planning als de analysefase is afgerond. Daarna wordt deze ter informatie met de stuurgroep gedeeld.</p> <p>Risico: (beperkte) capaciteit om dit project uit te voeren.</p>
	(3) Juridische analyse	<p>Het doel van de juridische analyse is het krijgen van zicht op wat er in de relevante regelgeving is opgenomen voor het verkrijgen, ontvangen, verkrijgen, opslaan, delen en uitwisselen van gegevens tussen de relevante VTH-partners. Hiermee wordt duidelijk of er knelpunten zijn voor het uitwisselen van gegevens, aan welke verplichtingen moet worden voldoen en of aanpassingen van wet- en regelgeving wenselijk is. De stuurgroep heeft ingestemd met de juridische analyse en vervolgacties op 23 juni 2023.</p>	<p>Plan van aanpak is beschikbaar begin Q1 van 2024. Dec 2023</p> <p>De analyse is volgens planning opgeleverd.</p>

<p>(4) Project Datakwaliteit Toezicht</p>	<p>Lopende acties: (A) Verbeteren datakwaliteit (aanlevering aan Inspectieview Milieu (IvM)). (B) Praktijkvoorbeelden waarin werken met data (van IvM) tot verbeteringen leidt (showcases). (C) Analyses doen met gegevens uit IvM: genereren van inzicht. De planning uit het pijlerplan is voor A, B en C niet gehaald. Er vindt een herijking plaats.</p> <p>Gerelateerde actie: (D) Verbeteren datakwaliteit handhaving zal in een volgende VGR als apart onderwerp worden opgenomen. De beoogde planning is niet gehaald.</p>	<p>De planning voor de acties (A), (B) en (C) wordt herzien met datgene wat gedurende de looptijd van het programma nog gerealiseerd kan worden. De planning zal in Q1 van 2024 ter informatie met de stuurgroep gedeeld worden.</p> <p>Voor actie (D) geldt een geplande oplevering van de resultaten van de analyse in Q4 van 2024; de analyse heeft, t.o.v. andere werkzaamheden, lagere prioriteit gekregen.</p>	
<p>(5) Definitiestudie Register MBA's en Inrichtingen</p>	<p>De rapportage 'Definitiestudie uniforme registratie milieubelastende activiteiten en inrichtingen' is opgeleverd. De stuurgroep heeft op 23 juni 2023 een besluit genomen over de ontwikkelrichting en vervolgstappen.</p> <p>De definitiestudie is vertaald naar een ontwerp voor het register inrichtingen MBA's. Dit is in november ingebracht in de stuurgroep, met het advies opvolgen van de realisatie van het register.</p>	<p>De definitiestudie is volgens planning opgeleverd.</p> 	
<p>(6) Opstellen stelselafspraken</p>	<p>Het doel is het opstellen van een standaard informatiemodel voor het uitwisselen van gegevens (partijen gaan dezelfde taal spreken). Het concept begrippenmodel is niet geleverd eind 2023, maar wordt doorgeschoven naar Q1 van 2024.</p>	<p>In Q1 van 2024 wordt het begrippenmodel ontwikkeld.</p> <p>In Q2 van 2024 wordt het begrippenmodel verder gedetailleerd.</p>	
<p>(7) Gezamenlijke data-analyse omgeving</p>	<p>Het doel is een gezamenlijke data-analyse omgeving voor het VTH-stelsel. Daartoe is een definitiestudie naar de opzet en werking van een gezamenlijke data-analyse omgeving voor het VTH-stelsel uitgevoerd.</p>	<p>De planning wordt in Q1 van 2024 herzien en ter informatie gedeeld met de stuurgroep.</p> <p>Risico: beperkte capaciteit om dit project uit te voeren</p>	<p>Dec 2023</p>
<p>(8) I-governance</p>	<p>I-governance behelst een voorstel voor de governance op de informatievoorziening. Dit wordt gebaseerd op een analyse van casuïstiek.</p>	<p>Het concept I-governance model wordt opgeleverd in Q1 van 2024.</p>	<p>Dec 2023</p>
<p>(9) Communicatie & stakeholdermanagement</p>	<p>Gezien de meerjarige opgave van en de constatering in de gateway-review intensificeert pijler 3 op communicatie en stakeholdermanagement. Dit is een aanvulling op de IBP-brede communicatie en de communicatie binnen de P3-projecten.</p>	<p>Een planning volgt nog n.a.v. plan van aanpak dat in Q1 van 2024 wordt opgesteld en ter informatie wordt gedeeld met de stuurgroep.</p>	<p>Dec 2023</p>
<p>(10) Adviseren</p>	<p>Ook de andere pijlers en stelselpartijen kunnen gebruik kunnen maken van de expertise binnen pijler 3. De volgende acties lopen: (A) Openbaarmaking data; o.a. met pijler 2. (B) Pijler 5 risico-gestuurd toezicht en het opstellen van een landelijk model voor risicoanalyse. (C) Pijler 6 het beschrijven van de informatievraag achter de Staat van VTH en de inrichting van het monitoringsysteem. (D) Werkzaamheden in samenwerking met OD's in het kader van de SPUK-regeling. (E) Beantwoording aan de motie Hagen/Sneller over het beschikbaar krijgen van een gedeeld informatiesysteem (met IenW).</p>	<p>Een planning volgt nog voor de verschillende (relevante onderwerpen binnen de) acties. Het tijdsplan verschilt per onderdeel; de stuurgroep wordt in 2024 tijdig geïnformeerd.</p>	<p>Dec 2023</p>
<p>(11) Opvolging gateway-review</p>	<p>Opvolging acties en stappen n.a.v. gateway-review: (A) Stuurgroep en IBP VTH investeren meer in elkaar t.a.v. pijler 3. (B) Ontwikkeling van een gezamenlijk beeld van de ambitie, de opgave, interventies en de impact door stuurgroep en IBP. (C) Expliciteren en concretiseren van de reikwijdte en resultaten van pijler 3. (D) Organiseren en borgen naar voren halen. (E) Intensiveren en meer gerichte communicatie en stakeholdermanagement. (F) Versterking capaciteit en deskundigheid.</p>	<p>Planning (A) en (E) doorlopend gedurende looptijd IBP VTH Planning (B), (C), (D) en (F) afgerond in Q1 van 2024.</p>	<p>Dec 2023</p>

Pijler/titel	Onderwerpen	Voortgang en doel	Planning/risico's
4 Kennisinfra-structuur	(1) Visie	In het kader van het inventariseren van kennisnetwerken is een richtinggevende visie Kennisinfrastructuur Fysieke Leefomgeving (KISFL) opgesteld over verschillende aspecten van kennis en de toepassing ervan binnen het VTH-domein. De visie is vastgesteld in het bestuurlijk overleg van 22 juni 2023. Bij de visie zat een inventarisatie van hoe de huidige kennisplatforms gerelateerd aan thema's uit het PleK (voorheen Veluweberaad) georganiseerd zijn. Op basis van de visie en inventarisatie is in Q3 en Q4 van 2023 gewerkt aan een concreet toekomstbeeld van hoe de KISFL binnen het VTH-domein eruit kan komen te zien. Dit is gebeurd aan de hand van een best guess van de SOLL-situatie die de toekomstige KIS VTH weergeeft.	De SOLL-situatie van de KISFL-VTH wordt op basis van de projecten die onderdeel zijn van het pijlerplan in Q2 van 2024 herijkt. De best guess van de SOLL-situatie – de feitelijk nul-situatie van de KISFL VTH – wordt op basis van lessons learned uit onderdeel (2) 'Kennisplatforms' in Q3 2023 opgeleverd.
	(2) Kennisplatforms	Er wordt gewerkt aan het (door)ontwikkelen van verschillende kennisplatforms gerelateerd aan thema's uit het PleK. Er worden randvoorwaarden opgesteld om het nationale kennislandschap en regionale kennisschakels succesvol te implementeren én structureel te borgen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de volgende thema's: (A) Zeer zorgwekkende stoffen (try-out). Het projectplan is goedgekeurd in de stuurgroep. De voortgang wordt apart besproken in het algemene deel van deze VGR onder kopje "Try-outs". (B) Afval of grondstof. De oplevering was voorzien eind 2023, maar dit is niet gehaald vanwege uitval kwartiermaker. (C) Kennisplatform energie transitie. (D) Bodem en ondergrond. (E) Kennisdeling bodemenergiesystemen (try-out). Het projectplan is goedgekeurd in de stuurgroep van juni 2023. Een aangepast projectplan is aan de stuurgroep van 21 november 2023 voorgelegd. De uitvoering is in overleg met programmteam al gestart in Q3 van 2023. De voortgang wordt apart besproken in het algemene deel van deze VGR onder kopje "Try-outs". (F) F-stoffen; de oplevering van de evaluatie is iets vertraagd. Deze was voorzien in Q4 van 2023. Het IBP VTH biedt gedurende de looptijd de mogelijkheid om thema's in de vorm van try-outs toe te voegen.	De planning voor thema (B) is: Operationeel plan voor oprichting platform afval en grondstof wordt in Q1 van 2024 voorgelegd aan bestuurlijk omgevingsberaad, de stuurgroep en het bestuurlijk overleg. Juni 2023
			De planning voor thema (C) is: Het conceptprojectplan wordt in Q3 van 2024 opgeleverd. Juni 2023 Het definitieve projectplan is in Q4 van 2024 gereed; voor beëindiging looptijd IBP VTH. De uitvoering n.a.v. het projectplan volgt in Q4 van 2024.
			De planning voor thema (D) is: In Q1 van 2024 wordt een plan van opgeleverd voor een landelijk kennisplatform bodem en ondergrond. Juni 2023
			De planning voor thema (F) is: In Q1 van 2024 wordt er een evaluatie opgeleverd van het door de ILT opgeleverde onderzoek naar F-stoffen in het licht van de kennisinfrastructuur. De evaluatie wordt ter informatie gedeeld met de stuurgroep. Juni 2023
	(3) Opleiding, scholing en arbeidsmarkt	In het kader van de opleiding, scholing en arbeidsmarkt lopen er drie deelprojecten: (A) Landelijke Omgevingsdienst NL Academie (ODNL Academie). De businesscase is in de stuurgroep van 9 juni besproken en er is besloten voor de voorkeursvariant te gaan. Hiervoor is een implementatieplan opgesteld dat op 21 november 2023 aan de stuurgroep is voorgelegd. Ook wordt gewerkt aan een meerjarenplan voor de ODNL Academie 2024-2028. (B) Opleidingen in relatie tot kwaliteitscriteria; als onderdeel van het meerjarenplan voor de ODNL Academie 2024-2028 wordt er een advies opgesteld hoe te komen tot een opleidingspakket in relatie tot de kwaliteitscriteria voor medewerkers uitvoering VTH en hoe de kwaliteit van de medewerkers te bewaken. Dit stond gepland voor Q1 van 2024, maar wordt doorgeschoven naar Q2 van 2024. Dit wordt structureel geborgd in de ODNL Academie. (C) Arbeidsmarktbenadering en naamsbekendheid; het voorbereiden en uitvoeren van een landelijke arbeidsmarktcampagne. Het campagneplan voor naamsbekendheid is in de stuurgroep van 21 november 2023 voorgelegd.	De planning voor project (A) is: De implementatiefase op basis van het implementatieplan vindt plaats tot en met Q4 van 2024. In Q2 2024 volgt een meerjarenplan voor de ODNL Academie voor 2024-2028. De planning voor project (B) is: In Q2 van 2024 wordt er een advies opgeleverd hoe te komen tot een opleidingspakket en hoe de kwaliteit van de medewerkers te bewaken. Het advies wordt als onderdeel van het meerjarenplan van de ODNL Academie 2024-2028 ter besluitvorming aan de stuurgroep en het bestuurlijk overleg voorgelegd. Juni 2023

		(D) Traineeprogramma; in Q3 van 2023 is een projectplan opgeleverd om te onderzoeken hoe een traineeprogramma VTH eruit kan zien en welke rol Omgevingsdienst NL daarbij kan vervullen (nieuw!). Met de uitvoering is gestart in Q4 van 2023.	<p>De planning voor project (C) is: De volgende specifieke activiteiten zijn voorzien in Q1 en Q2 van 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het uitvoeren van het plan door gebruik te maken van diverse vormen van communicatie. Een gezamenlijke aanpak door omgevingsdiensten te bewerkstelligen. Het evalueren van de regionale arbeidsmarktprojecten in het kader van de SPUK IBP VTH, het benoemen van succesfactoren voor een betere positie op de arbeidsmarkt. <p>De planning voor project (D) is: Advies over inhoud en organisatie traineeprogramma en rol ODNL is voorzien eind Q2 van 2024.</p>	Dec 2023
	(4) Informatie en communicatie	<p>In het kader van informatie en communicatie lopen er drie deelprojecten:</p> <p>(A) Communicatiestrategie (voorheen communicatieplan); om de resultaten van de projecten binnen pijler 4 ook na einde IBP structureel te borgen, wordt er een communicatiestrategie opgesteld inclusief een voorstel voor werkafspraken tussen de omgevingsdiensten en met evt. de andere betrokken partijen. Oplevering was voorzien in Q4 van 2023, maar dit is niet gehaald. De strategie is afhankelijk van de resultaten van de overige projecten. Er is inmiddels een strategisch communicatieadviseur ingehuurd die in Q1 2024 gaat starten.</p> <p>(B) Kennisnet; het inrichten van een kennisnet met themagerichte platforms waarin kennis ontsloten en gedeeld kan worden voorzien van een goede ICT-ondersteuning als voorzetting van het huidige kennisnet. Eerder (bij de VGR van juni 2023) was de planning al bijgesteld van Q4 van 2023 naar Q2 van 2024.</p> <p>(C) Samenwerking IPLO/ inrichten frontoffice; in samenwerking met RWS en IPLO zal de informatievoorziening over wet- en regelgeving en de informatievoorziening over de uitvoering van VTH in relatie tot wet -en regelgeving worden vormgegeven waarbij bureau ODNL i.o. een sleutelrol speelt. Oplevering was voorzien in Q1 van 2024, maar de planning is bijgesteld naar Q2 van 2024.</p> <p>Het ontbreken van capaciteit heeft vertraging opgeleverd voor de realisatie van de deelprojecten; momenteel wordt er naar een projectleider voor onderdeel (C) gezocht. Nadat duidelijk is hoe het frontoffice eruitziet, kan gestart worden met een plan voor de inrichting van kennisnet.</p>	<p>De planning voor project (A) is: Start in Q1 2024 en oplevering communicatiestrategie in Q2 van 2024. Implementatie eind 2024.</p> <p>De planning voor project (B) is: Een plan voor de doorontwikkeling van kennisnet is gereed in Q2 van 2024. Kennisnet is ingericht voor einde 2024.</p> <p>De planning voor project (C) is: Binnen het samenwerkingsverband RWS en IPLO zal in Q2 van 2024 de informatievoorziening worden opgeleverd.</p>	Juni 2023
<i>Pijler/titel</i>	<i>Onderwerpen</i>	<i>Voortgang en doel</i>	<i>Planning/risico's</i>	
5 Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving	(1) Regionale planning	<p>Er wordt een handreiking ontwikkeld voor regionale planning die landelijk wordt uitgerold. Dit betreft onder andere het format voor de probleem- en risicoanalyse en het meerjarenprogramma (BIG-8).</p> <p>De uitgangspunten voor verdere uitwerking zijn door de stuurgroep van 23 juni 2023 goedgekeurd en in het bestuurlijk overleg op 13 september 2023 (schriftelijke ronde) geaccordeerd.</p>	<p>Besluitvorming in de stuurgroep is gepland op 16 januari 2024. In Q1 van 2024 wordt gestart met de begeleiding van regio's om de handreiking te implementeren.</p> <p>Risico: SPUK-gelden zijn beschikbaar, maar feitelijke capaciteit ontbreekt bij de omgevingsdiensten. Mede als gevolg van de inzet van de capaciteit voor de implementatie van de Omgevingswet.</p>	
	(2) Mandaten en delegatie	Uitwerking landelijk modelmandaat voor meer harmonisering in de uitvoering.	<p>Het rapport zal in de stuurgroep van 19 maart 2024 voor besluitvorming worden aangeboden.</p> <p>Risico: Vanwege implementatie van de Omgevingswet wordt implementatie van het modelmandaat mogelijk niet direct opgepakt; veel diensten hebben hun mandaten al omgezet in afstemming met hun partners naar de Omgevingswet.</p>	

	(3) Positie en rol Directeur OD	Om een meer onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving te realiseren wordt een profiel opgesteld, als basis voor benoemings- en evaluatieprocedure.	Resultaten worden verwerkt in een voorstel voor de stuurgroep van 16 januari 2024.
	(4) OGON	Versterking opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap is een nieuw onderdeel van pijler 5 en bouwt voort op OGON-netwerk van VNG. Voor de versterking van het VTH-stelsel is het belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden van alle partijen in het stelsel duidelijk worden, dat er aandacht wordt besteed aan de governance en dat er wordt geïnvesteerd in de relaties. Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest met veel deelname van gemeenten en bespreking van onderwerpen als voldoen aan robuustheidscriteria en versterken van de rol als opdrachtgever.	In 2024 zullen drie OGON-bijeenkomsten worden georganiseerd. Dec 2023
<i>Pijler/titel</i>	<i>Onderwerpen</i>	<i>Voortgang en doel</i>	<i>Planning/risico's</i>
6 Monitoring kwaliteit milieu- toezicht	(1) Visitaties	Met de aanbevelingen vanuit de eerder uitgevoerde evaluatie zijn de visitaties (door)ontwikkeld. Na de eerste vier pilots zijn de 'echte' visitaties gestart bij andere omgevingsdiensten met tot doel in 2023 en 2024 alle omgevingsdiensten te visiteren. Inmiddels zijn er in totaal tien visitaties afgerond. Twee anderen visitaties zijn uitgevoerd en de rapportages worden momenteel geschreven. Een aantal andere visitaties zijn in voorbereiding. Een eerste concept 'rode draden document' van de vier pilots is in juni aan de stuurgroep aangeboden.	De planning voor de vervolvisitaties is gereed. De visitaties worden uitgevoerd volgens planning.
	(2) ILT onderzoeken	De ILT heeft twee onderzoeken uitgevoerd: inzameling e-waste en asbestverwijdering. Het rapport over inzameling e-waste is door lenW, voorzien van een beleidsreactie, toegezonden aan de Tweede Kamer. ■ De ILT is inmiddels een derde onderzoek gestart met als thema geluid.	Het 3e themaonderzoek met betrekking tot geluid is in de eerste helft 2024 afgerond. In januari 2024 start het 4e themaonderzoek naar vergunningverlening ZSS en is tweede helft 2024 afgerond. In de loop van 2024 wordt ook nog met het 5e themaonderzoek naar bodem/bouwstoffen en het 6e themaonderzoek naar afval/ afvaltransporten gestart. Alle onderzoeken worden uitgevoerd en opgeleverd volgens de planning.
	(3) Horizontale verantwoording	Het project is gestart volgens het pijlerplan, maar de oorspronkelijk planning is, met akkoord van de stuurgroep, (deels) met een halfjaar vertraagd. Eind 2023 is het theoretisch kader opgesteld en afgerond met daarin de verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders.	In Q1 van 2024 volgen pilots bij vier omgevingsdiensten. In Q2 en Q3 van 2024 wordt er een werkwijze/handleiding opgesteld. In Q3 van 2024 wordt de werkwijze/handleiding opgeleverd. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risico: meerdere deelnemers aan dit onderwerp zijn ook bij andere pijlers betrokken, waardoor de geplande inzet niet altijd mogelijk is.</div>
	(4) Opstellen Staat van VTH (SvVTH)	Het ontwikkelen van de SvVTH is gestart; er zijn interviews afgenomen en de studie naar andere 'Staten van andere sectoren' is afgerond. Met dit inzicht is een blauwdruk voor de SvVTH opgesteld die in de stuurgroep van 19 september 2023 is geaccordeerd. Nu wordt als eerste een model uitgewerkt samen met de Erasmus universiteit voor een goed gefundeerde uitspraak over de werking van het VTH-stelsel. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het uitwerken van andere onderdelen voor de SvVTH.	Planning: De planning zoals in het projectplan is beschreven wordt gehaald. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko: meerdere deelnemers aan dit onderwerp zijn ook bij andere pijlers betrokken, waardoor de geplande inzet niet altijd mogelijk is. Beoogde inzet van omgevingsdienst op basis van de SPUK blijkt beperkt mogelijk waardoor de gewenste capaciteit niet beschikbaar is.</div>

	(5) Interbestuurlijk toezicht	<p>Er is vaker onderzoek gedaan naar de werking van interbestuurlijk toezicht (IBT), ook door de commissie Van Aartsen. De conclusie van de commissie luidt: IBT functioneert onvoldoende om de noodzakelijke checks en balances te garanderen.</p> <p>Een genoemde oorzaak is dat volgens de Wet revitalisering generiek toezicht IBT sober en terughoudend toegepast moet worden. Het doel is te onderzoeken hoe, binnen het huidige wettelijke kader, IBT kan bijdragen het geconstateerde toezichtsgat te verkleinen of op te lossen.</p> <p>De stuurgroep van 21 december 2022 heeft daarom – aanvullend op de andere onderwerpen in pijler 6 – gevraagd om IBT toe te voegen aan pijler 6. Hiervoor is een voorstel opgesteld dat in de stuurgroep van 14 maart 2023 is besproken.</p>	<p>Er is een aanvang gemaakt om IBT te beschouwen i.r.t. de doelen van pijler 6.</p> <p>In Q1 van 2024 wordt hierover gerapporteerd aan de stuurgroep.</p> <p>Risico: meerdere deelnemers aan dit onderwerp zijn ook bij andere pijlers betrokken, waardoor de geplande inzet niet altijd mogelijk is.</p>	Dec 2023
--	-------------------------------	--	--	----------
